Cronoprogramma (diagramma Gantt)

Evidenziazione periodo: 1

Durata del piano | Inizio effettivo | % completamento
Effettiva (oltre piano) | % completamento (oltre piano)

ATTIVITÀ	IMPORTI	PRODUZIONE GIORNALIERA	INIZIO DEL PIANO (GIORNO)	DURATA DEL PIANO (GIORNO)	INIZIO EFFETTIVO (GIORNO)	DURATA EFFETTIVA (GIORNI)	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
incantieramento	**16.433,46**	**1.173,82**	1	14	1	14	**100%**
realizzazione pali	**99.697,52**	**3.323,25**	15	28	12	30	**100%**
muro fondazione	**67.138,80**	**2.582,26**	43	21	38	26	**100%**
muro elevazione	**21.004,08**	**636,49**	64	28	62	33	**100%**
ripristini	**28.949,18**	**1.033,90**	92	21	88	28	**100%**
cunetta e pozzetto	**12.387,35**	**375,37**	113	28	106	33	**100%**
asfalti	**64.091,78**	**3.051,99**	141	14	136	21	**100%**
segnaletica e finiture	**25.335,49**	**873,64**	155	26	152	29	**100%**
	335.037,67			180			

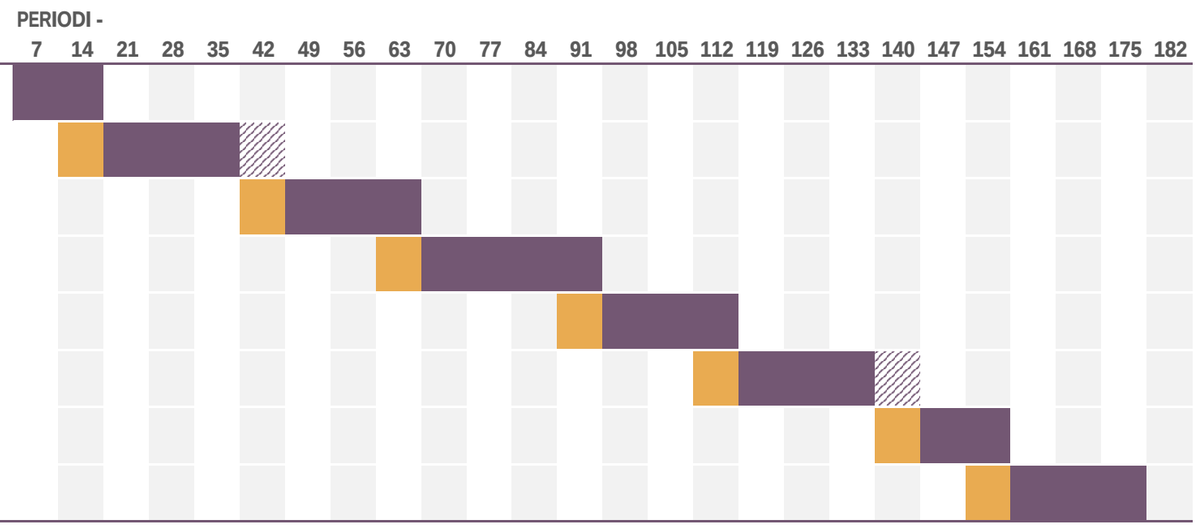

produzione media settimanale	8.276,73	31.564,49	23.262,75	23.512,75	21.712,75	36.588,59	14.875,83	15.100,83	19.456,24	4.355,41	4.405,41	3.655,41	9.792,71	6.137,30	6.312,30	7.965,91	2.357,62	2.403,62	2.360,62	23.724,55	21.363,93	27.369,39	6.005,46	6.226,46	6.203,18	334.990,25
